

INTERNE FASSUNG

Claimreport

Anspruchsdokumentation zu Verspätete Beistellung
Lüftungskomponenten

Interne Fassung fuer Mandant und Claimmanagement

MANDANT

Demo-Mandant GmbH

PROJEKT

CT-204 · Spezialschiff-Neubau

VORGANG

CLAIM-DEMO-001 - Verspätete Beistellung
Lüftungskomponenten

STAND

Demo v1 · 09.08.2026

FORDERUNG

126.000 EUR

STATUS

Demo · synthetische Daten

REFERENZ

CLAIM-DEMO-001

ANLAGEN

3 Anlagen

EXECUTIVE SUMMARY

- Diese Mandantenfassung dokumentiert den aktuellen Bearbeitungsstand vollständig für interne Prüfung, Geschäftsführung, Claimmanagement und anwaltstauglich vorbereitete streitfallorientierte Bearbeitung.

01

SACHVERHALT

Die vorgesehenen Lüftungskomponenten wurden nicht rechtzeitig beigelegt. Das Montageteam konnte den Abschnitt nicht wie geplant abschließen.

Ausgangsnachricht / Beispielmail: Von: Projektleitung Demo Marine Systems · Betreff: Verzögerung Lüftungskomponenten Deck 3 · Bitte prüfen, ob Lieferschein, Terminplan und Fotodokumentation für die Claim-Bewertung ausreichen.

Auswirkung: 18 Kalendertage Verzug mit Mehrstunden und Umsteuerung im Montageablauf. Im Demo-Szenario wurde eine zugesagte Beistellung nicht rechtzeitig bereitgestellt. Dadurch konnten geplante Montageleistungen nicht vollständig im vorgesehenen Zeitfenster ausgeführt werden. Der Inhalt ist vollständig synthetisch und dient ausschließlich der öffentlichen Produktdemonstration.

02

CHRONOLOGIE

Demo · synthetische Daten

Tag 1: Geplanter Beginn der Montageleistungen im betroffenen Bereich.

Tag 4: Fehlende Komponente wird als Behinderung im Ablauf erkannt und per Beispielmail gemeldet.

Tag 9: Umsteuerung der Montagekolonne auf alternative Arbeitspakete.

Tag 18: Vorläufige Bewertung der terminlichen und wirtschaftlichen Auswirkung.

Frist: 12.07.2026.

03

ANSPRUCHS- / VERTRAGSBEZUG

Demo · synthetische Daten. Die Anspruchs- und Vertragsbezüge werden beispielhaft dargestellt, ohne echte Vertragsdaten, produktive Mandantendaten oder rechtliche Einzelfallbewertung zu verwenden.

Demo · synthetische Daten. Beispielhafte Anspruchsstruktur aus Behinderung, Mehrstunden, Wartezeit und Ablaufumsteuerung. Eine rechtliche Einzelfallprüfung oder echte Vertragsbewertung findet in der öffentlichen Demo nicht statt.

FORDERUNG / WIRTSCHAFTLICHE POSITION

Die wirtschaftliche Position beträgt nach aktuellem Arbeitsstand 126.000 EUR. Die Herleitung basiert auf dem dokumentierten Sachverhalt, der internen Bewertung und den zugeordneten Nachweisen.

Eine detaillierte Aufteilung nach Stunden, Material, Reisekosten oder weiteren Kostenarten ist in diesem Reportstand nicht Bestandteil der Fassung und sollte bei Bedarf als separate Forderungsaufstellung ergänzt werden.

Vorläufige wirtschaftliche Position: 126.000 EUR. Die Position steht im Demo-Kontext beispielhaft für Mehrstunden, Wartezeiten und Projektumsteuerung. Es handelt sich nicht um echte Abrechnung, keine E-Rechnung, keine Rechnungsnummer und keinen Versand.

Interne Bewertung im Demo-Kontext: Die dargestellte Störung ist nachvollziehbar dokumentiert, Beispielmail und Anlagen sind zugeordnet und die wirtschaftliche Position von 126.000 EUR ist als Arbeitsstand gekennzeichnet.

NACHWEISE UND ANLAGEN

Die Anlagen sind synthetische Nachweise aus der öffentlichen Demo. Sie zeigen beispielhaft, wie Fotodokumentation, Projektmeldung, Terminplanbezug und Relevanz im echten Claimreport strukturiert dargestellt werden.

NR.	NACHWEIS	TYP	DATUM / QUELLE	RELEVANZ / BEZUG
1	Demo-Nachweisfoto · Einbausituation	Fotodokumentation	Öffentliche Demo-Workbench	Belegt beispielhaft die betroffene Einbausituation und den blockierten Arbeitsbereich.
2	Demo-E-Mail · Projektmeldung	E-Mail / Projektmeldung	Browser-only Demo-Eingabe	Ordnet die Störungsmeldung beispielhaft dem Vorgang und der späteren Claim-Bewertung zu.
3	Demo-Terminplanauszug · Montagefenster	Terminplan	Synthetischer Projektterminplan	Ordnet die Verzögerung beispielhaft dem betroffenen Montagefenster zu.

BEWERTUNG / EINSCHÄTZUNG

Interne Bewertung im Demo-Kontext: Die dargestellte Störung ist nachvollziehbar dokumentiert, Beispielmail und Anlagen sind zugeordnet und die wirtschaftliche Position von 126.000 EUR ist als Arbeitsstand gekennzeichnet.

07

OFFENE PUNKTE

1. Nachweise vervollständigen und Zuordnung prüfen.
2. Wirtschaftliche Herleitung nach Stunden, Wartezeit und Umsteuerung schärfen.
3. Fehlende Nachweise anfordern und Reportversion freigeben.

08

EMPFEHLUNG


Fehlende Nachweise anfordern und Reportversion freigeben. Die Demo erzeugt keine Speicherung, keinen Upload, keinen Versand und keine echte Abrechnungs- oder E-Rechnungslogik.

ANLAGENVERZEICHNIS

#	ANHANGSTITEL	DATEI
1	Demo-Nachweisfoto · Einbausituation	anlage-01-demo-einbausituation.png
2	Demo-E-Mail · Projektmeldung	anlage-02-demo-projektmeldung.eml
3	Demo-Terminplanauszug · Montagefenster	anlage-03-demo-terminplan.pdf

ANLAGE 1

ANLAGE	1
TITEL	Demo-Nachweisfoto · Einbausituation
DOKUMENTTYP	Fotodokumentation
QUELLE / DATUM	Öffentliche Demo-Workbench
RELEVANZ / BEZUG	Belegt beispielhaft die betroffene Einbausituation und den blockierten Arbeitsbereich.

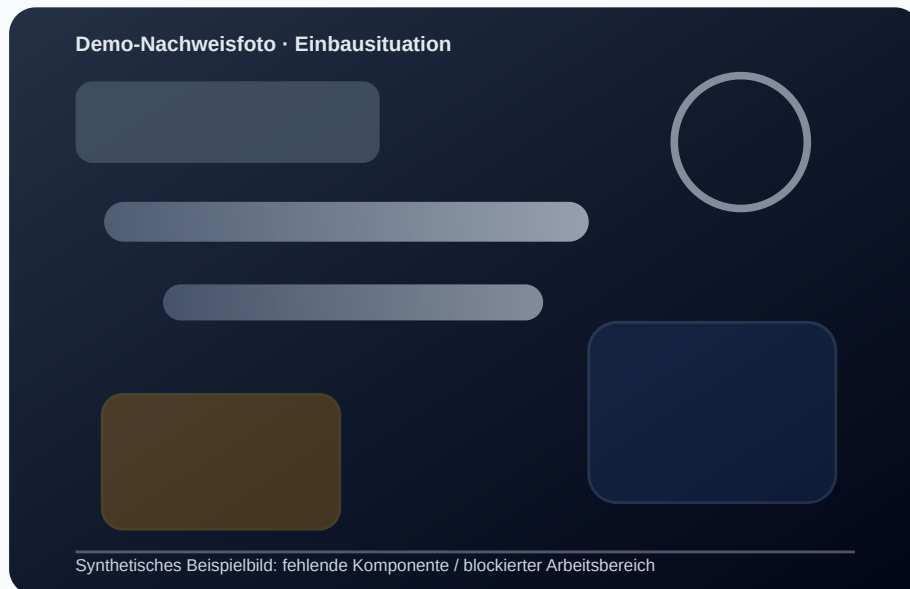

Anlage 1: anlage-01-demo-einbausituation.png

ANLAGE	2
TITEL	Demo-E-Mail · Projektmeldung
DOKUMENTTYP	E-Mail / Projektmeldung
QUELLE / DATUM	Browser-only Demo-Eingabe
RELEVANZ / BEZUG	Ordnet die Störungsmeldung beispielhaft dem Vorgang und der späteren Claim-Bewertung zu.

anlage-02-demo-projektmeldung.eml

Als Anlage geführt; Vorschau nicht eingebettet.

ANLAGE	3
TITEL	Demo-Terminplanauszug · Montagefenster
DOKUMENTTYP	Terminplan
QUELLE / DATUM	Synthetischer Projektterminplan
RELEVANZ / BEZUG	Ordnet die Verzögerung beispielhaft dem betroffenen Montagefenster zu.

anlage-03-demo-terminplan.pdf

Als Anlage gefuehrt; Vorschau nicht eingebettet.
